


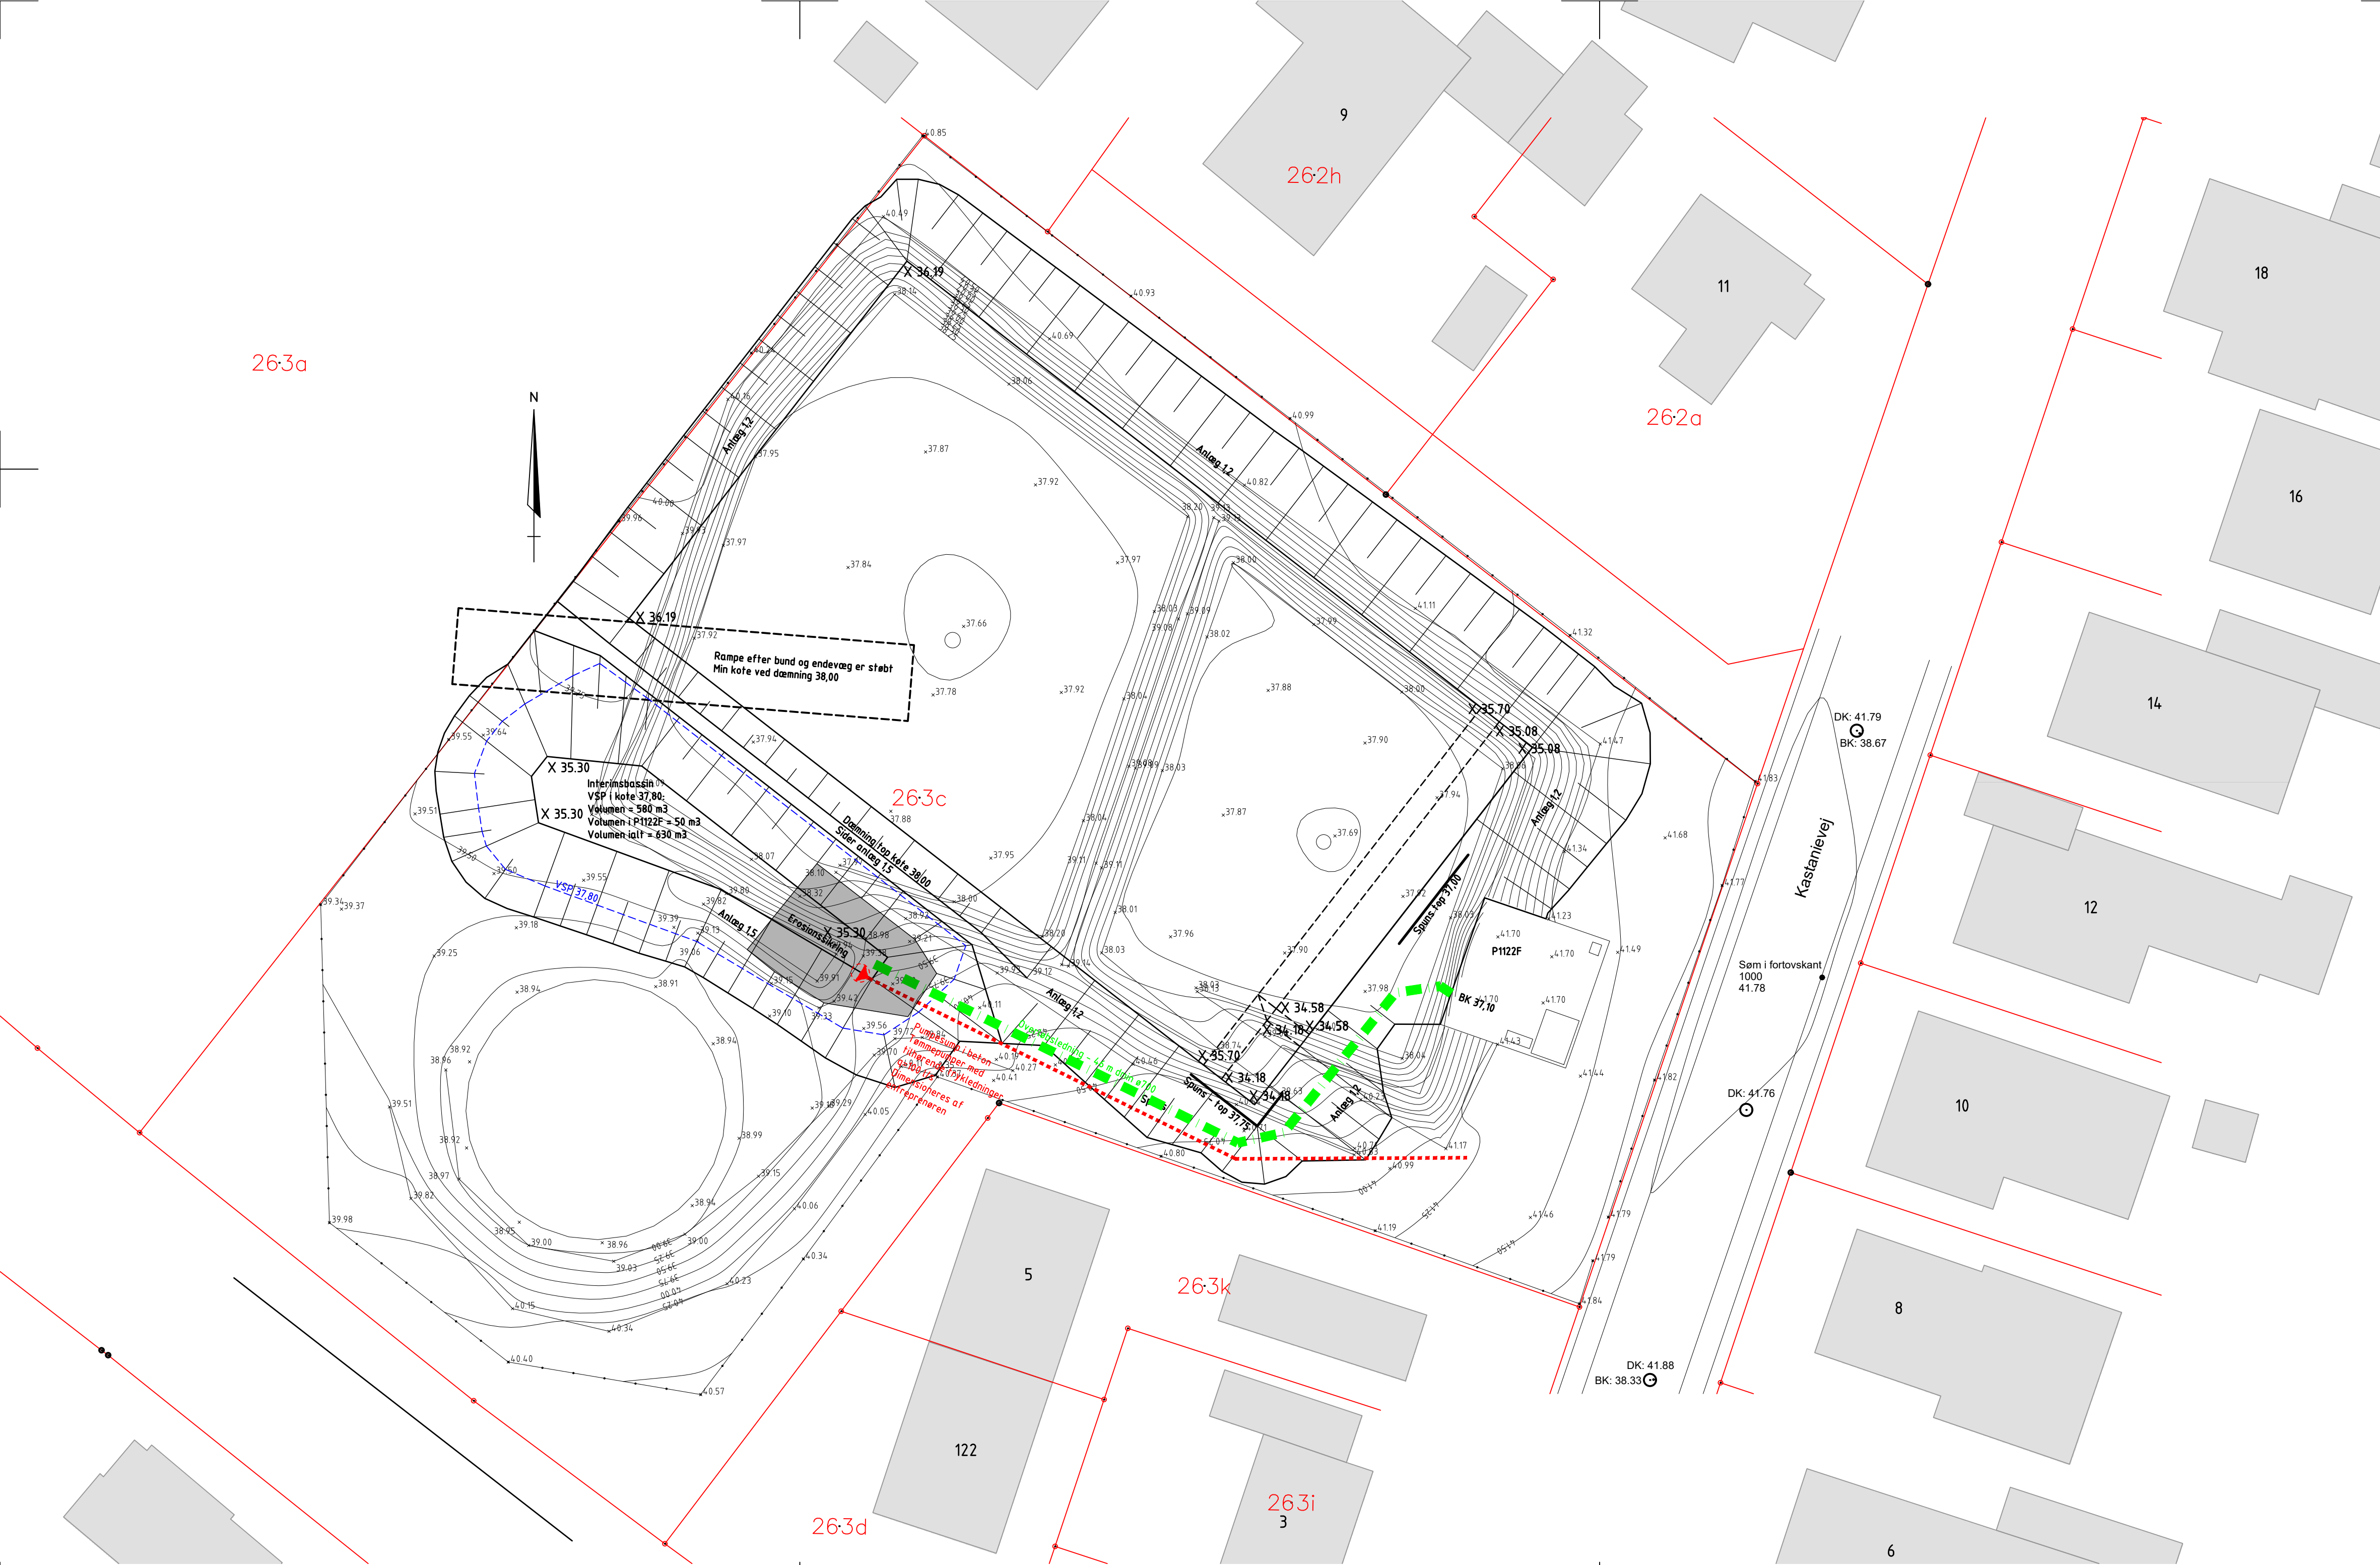

Note:

Arbejdsrytme for udgravning:

Udgravning for interimsbassin og bund for nyt bassin i eksisterende græs-bassin

Støbning af stribefundament langs dæmning til interimsbassin.

I en stabil tørvejrperiode udføres:

Ombygning af bygværk 2850110 - tilsløbning i den gamle V550b fjernes og der monteres midlertidig overførselskanal i ø14.000.

Udgravning ved P1122F vestside, hvor 1 stk. ø700 midlertidig overførselsledning føres ind i kote 37,10. Gennemføringen skal være tæt for min. 3 m vandtryk. Tildækning mod P1122F reetableres.

Midlertidig spuns mod sydøst og ved P1122F sættes.

Overførselsledningen lægges frem til interimsbassin

Udløbet i interimsbassin sikres mod erosion.

Overførselsbatterier i P1122F tilsluttes.

Herefter kan der fortsættes med udgravning i det eksisterende asfaltbassin.

Signatur:

Spuns efter entreprenørens eget valg, dimensioneres af entreprenøren

Overførselsledning, indvendig dim. min. ø700 mm - skal føre 14.00 l/s

Materialevalg, samlinger og forankringer dimensioneres af entreprenøren

Erosionssikring af bassinbund og sider.

Materialevalg og udførelse dimensioneres af entreprenøren

REVISION D:	REV. DATO	
REVISION C:	REV. DATO	
REVISION B:	REV. DATO	
REVISION A:	REV. DATO	
SAG:	SAGSNR.:	21033
BYGHERRE:	INITIALER:	BTB
	KS:	BR
EMNE:	TEGN. NR.:	1300
	MAL:	1:250
	DATO:	25.11.2021
	FORMAT:	420x840
INGENIØR:	VIBORG INGENIØRERNE A/S	TLF: 86 62 41 11
	FABRIKVEJ 4 · 8800 VIBORG	FAX: 86 62 99 06
		MAIL: info@vibing.dk
		WEB: www.vibing.dk
