Id	Opgavetils	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Foregående opgaver	Ressourcenavne
1							
2		Opstart	0 dage	ma 06-05-19	ma 06-05-19		
3		Etablering af byggeplads + jordepot	3 dage	ma 06-05-19	on 08-05-19		
4		Rydningsarbejde: fortov, kantsten begge sidder samt asfalt. Udføres løbende	68 dage	on 08-05-19	fr 30-08-19		
5		Opstilling af lysregulering og håndtering af omkørsler	12 dage	on 15-05-19	to 30-05-19		
6		**Kloakarbejder**	**78 dage**	**ma 20-05-19**	**on 25-09-19**		
7		Ved Rundkørsel 3091005R-3091010R, ø 200 mm pvc, d=1,64	5 dage	ma 20-05-19	fr 24-05-19		
8		Ved Rundkørsel 3091005S-3030910105, ø 200 mm pvc, d=2,42	3 dage	ma 27-05-19	on 29-05-19	7	
9		Søndermarksvej Hus nr: 22-24-26-28-30-32-34 3091010S-3091020S, ø 200 mm glat pvc, d=2,42-3,29	17 dage	to 30-05-19	fr 21-06-19	8	
10		Søndermarksvej Hus nr: 34-36-38-40 3091020S-3091030S, ø 200 mm glat pvc, d=3,29-3,37	10 dage	ma 24-06-19	fr 05-07-19	9	
11		Søndermarksvej Hus nr: 40-42-44-46-48 3091030S-3091040S, ø 200 mm glat pvc, d=3,37-3,68	13 dage	ma 08-07-19	on 14-08-19	10	
12		Primulavej Hus nr: 3-4-5-6-7-8-9-10 3091040S-3091050S, ø 200 mm glat pvc, d=3,68-2,89	15 dage	to 15-08-19	on 04-09-19	11	
13		Søndermarksvej Hus nr: 50-52 3091040S-2C10078, ø 200 mm glat pvc, d=3,68-3,35	7 dage	to 05-09-19	fr 13-09-19	12	
14		Øverste del af Søndermarksvej Etape 7: hævet flader samt vejbrønde	8 dage	ma 16-09-19	on 25-09-19	13	
15		Stikledninger for skelbrønde og rendestensbrønde medtages løbende	78 dage	ma 20-05-19	on 25-09-19		
16		**Fjernvarmearbejde**	**20 dage**	**ma 12-08-19**	**fr 06-09-19**		
17		Fjernvarmearbejde medtages løbende	20 dage	ma 12-08-19	fr 06-09-19		
18		**Belægningsarbejder**	**74 dage**	**on 29-05-19**	**ma 30-09-19**		
19		Retablering af kantsten og fortov medtages løbende	45 dage	ma 24-06-19	fr 13-09-19		
20		Retablering af indkørsler medtages løbende	40 dage	ma 01-07-19	fr 13-09-19		
21		Retablering af asfalt Mærsk Stigs vej	1 dag	on 29-05-19	on 29-05-19		
22		Retablering af asfalt Etape2-Etape 5	1 dag	to 05-09-19	to 05-09-19		
23		Retablering af asfalt Etape6-Etape7	1 dag	ma 30-09-19	ma 30-09-19		
24		Afleveringsdato	0 dage	ti 01-10-19	ti 01-10-19		

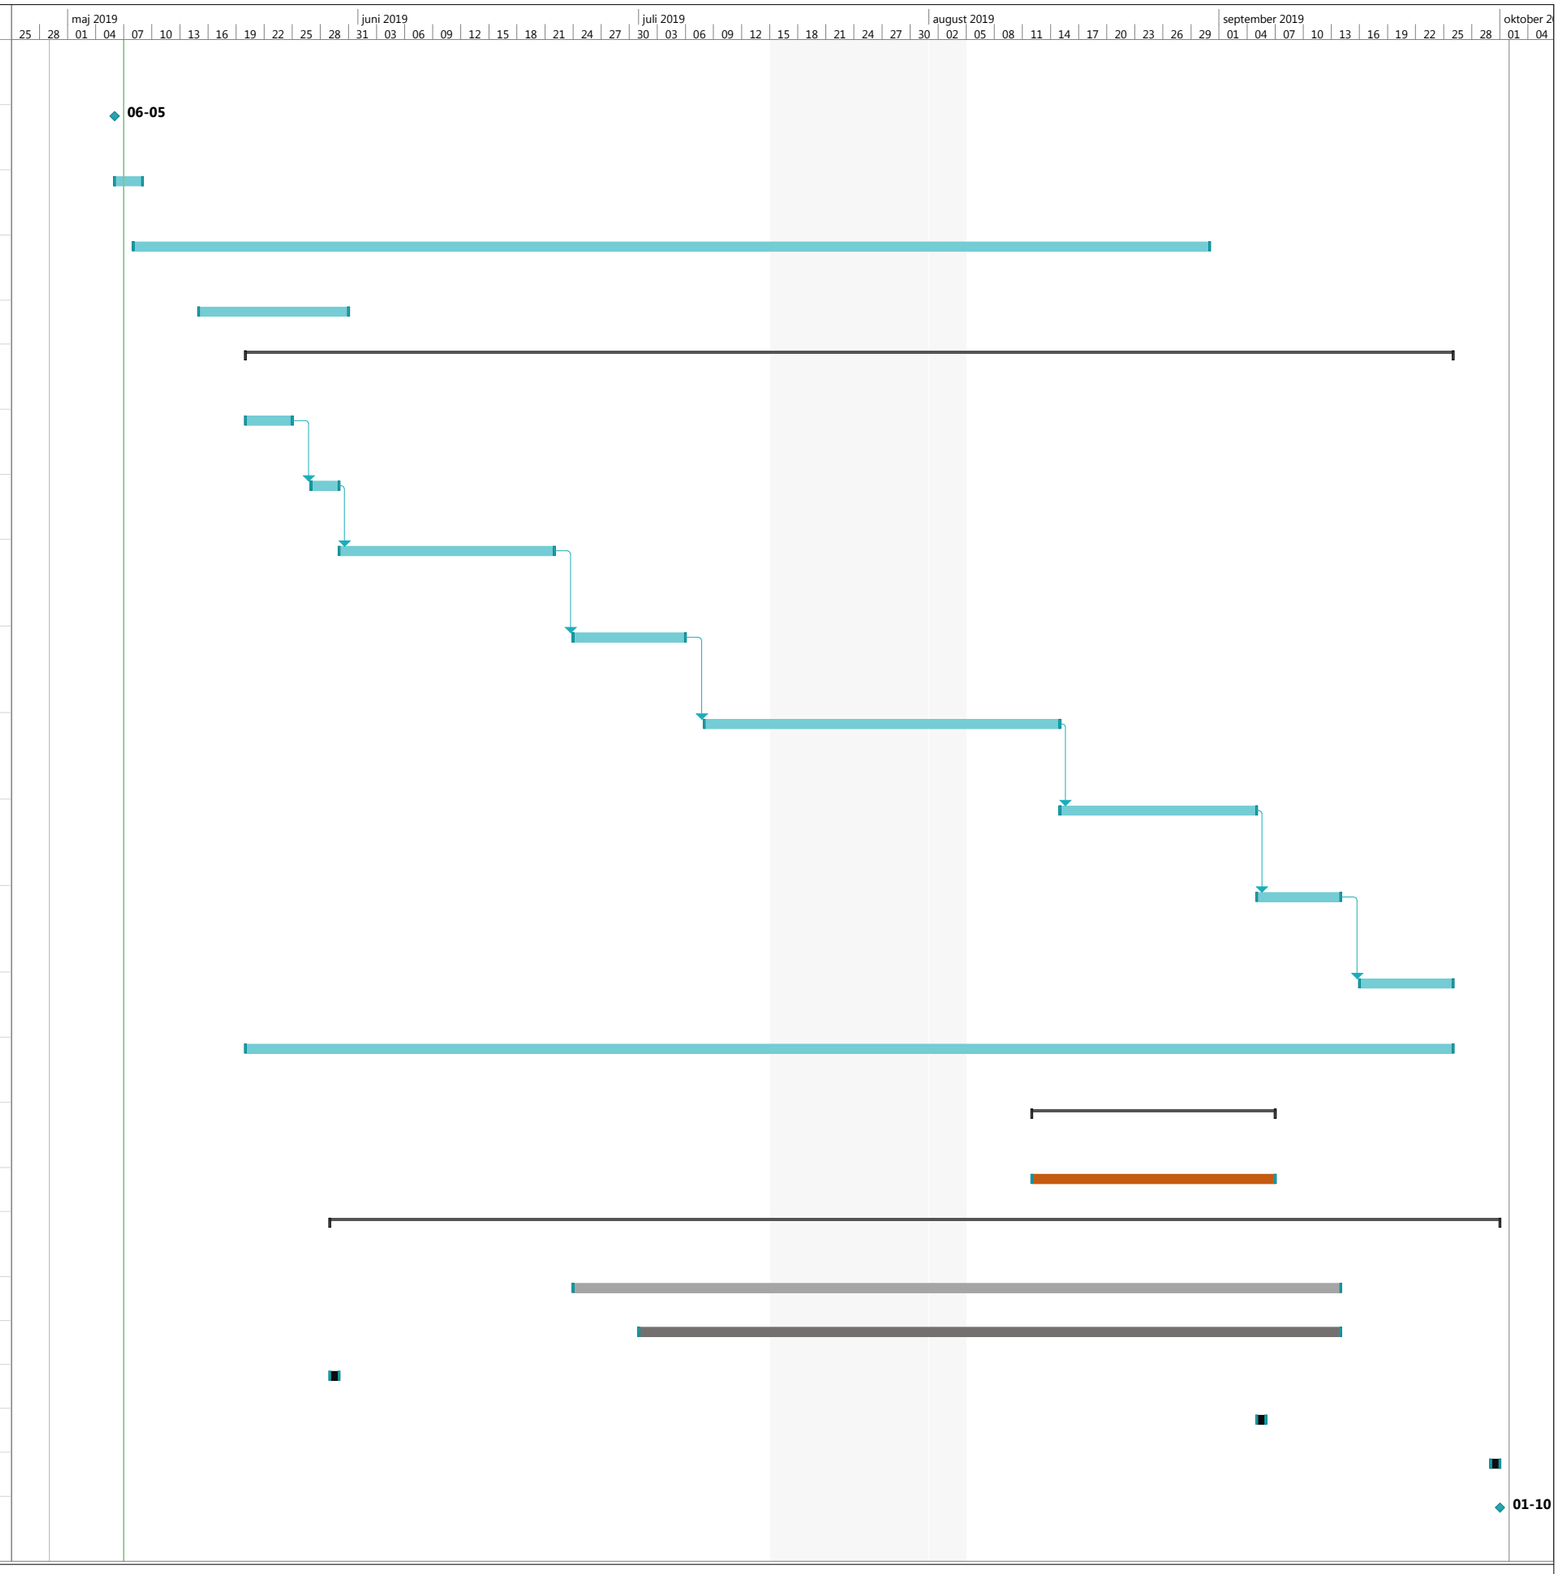

Projekt: Søndermarksvej og Pri
Dato: ti 07-05-19

Opgave · Opdeling · Milepæl · Hovedopgave · Projektoversigt · Inaktiv opgave · Inaktiv milepæl · Inaktiv oversigt · Manuel opgave · Kun varighed · Manuel oversigtsopløftning · Manuel oversigt · kun start · Kun slutdato · Eksterne opgaver · Ekstern milepæl · Deadline · Fremdrift · Manuel status
