1247 Afskærende regnvandsledning, Møldrup - Detailtidsplan

JOKUMSEN

Id	Opgavetil	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato
1		**Afskærende ledning, Møldrup**	**156 dage**	**ti 13-05-25**	**ti 16-12-25**
2					
3		Afgravning af overjord (forberedelse)	80 dage	ti 13-05-25	ma 01-09-25
4		W21001U --> W21002R (kun 20m ud af 80m)	4 dage	ma 19-05-25	to 22-05-25
5		W21002R --> W21003R (64m Ø1000 bue)	10 dage	fr 23-05-25	ma 09-06-25
6		W21003R --> W21005R (80m Ø1000 bue)	6 dage	ti 10-06-25	ti 17-06-25
7		W21005R --> W21005RX (70m Ø1000 bue)	5 dage	on 18-06-25	ti 24-06-25
8		W21005RX --> W21510R (93m Ø1000)	9 dage	on 25-06-25	ma 07-07-25
9		W21510R --> W00332R (29m Ø900)	3 dage	ti 08-07-25	to 10-07-25
10		W00332R --> W00342R (286m Ø900)	20 dage	fr 11-07-25	to 21-08-25
11		W00342R --> W00327R (40m Ø900)	5 dage	fr 22-08-25	to 28-08-25
12		W00327R --> W00326R (45m Ø900)	5 dage	fr 29-08-25	to 04-09-25
13		W00326R --> W00323R (28m Ø900)	3 dage	fr 05-09-25	ti 09-09-25
14		W00323R --> W00322R (95m Ø900)	8 dage	on 10-09-25	fr 19-09-25
15		W00322R --> W00397R (18m Ø900)	2 dage	ma 22-09-25	ti 23-09-25
16		W00397R --> W00317R (159m Ø900 i asfalt)	30 dage	on 24-09-25	ti 04-11-25
17		W00317R --> W00400R (3m Ø315 i asfalt)	2 dage	on 05-11-25	to 06-11-25
18		W00317R --> W00345RX (34m Ø900 i asfalt)	8 dage	fr 07-11-25	ti 18-11-25
19		W00345R -->W00345R (12m Ø900 i asfalt)	4 dage	on 19-11-25	ma 24-11-25
20		W100040S --> W11044FX (16m Ø110 PE i asfalt)	5 dage	ti 25-11-25	ma 01-12-25
21		Færdiggørelse og retablering	20 dage	on 19-11-25	ti 16-12-25
22					
23					
24		**Helligdage og ferie**	**144 dage**	**to 29-05-25**	**ti 16-12-25**
25		Kristi Himmelfart	2 dage	to 29-05-25	fr 30-05-25
26		Sommerferie	10 dage	ma 14-07-25	fr 25-07-25
27					
28					
29		Aflevering	0 dage	ti 16-12-25	ti 16-12-25

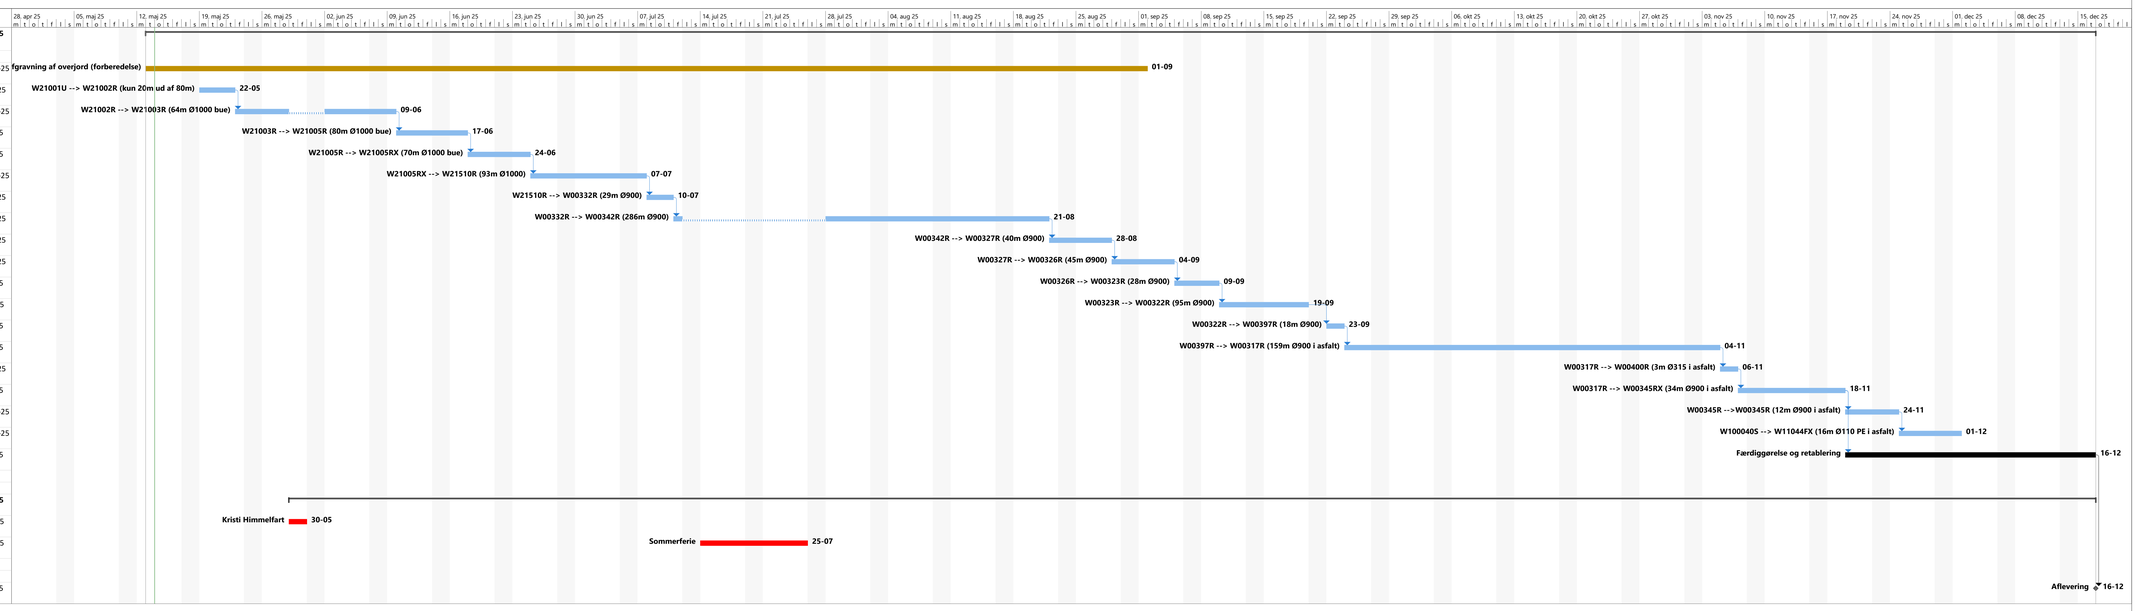

Projekt: Projekt1
Dato: on 14-05-25

Opgave | Milepæl | Projektoversigt | Inaktiv milepæl | Manuel opgave | Manuel oversigtsopløftning | Kun start | Eksterne opgaver | Deadline | Manuel status
Opdeling | Hovedopgave | Inaktiv opgave | Inaktiv oversigt | Kun varighed | Manuel oversigt | Kun slutdato | Ekstern milepæl | Fremdrift
