Tidsplan vedr. Løvel Etape 2/3 d. 04-03-26
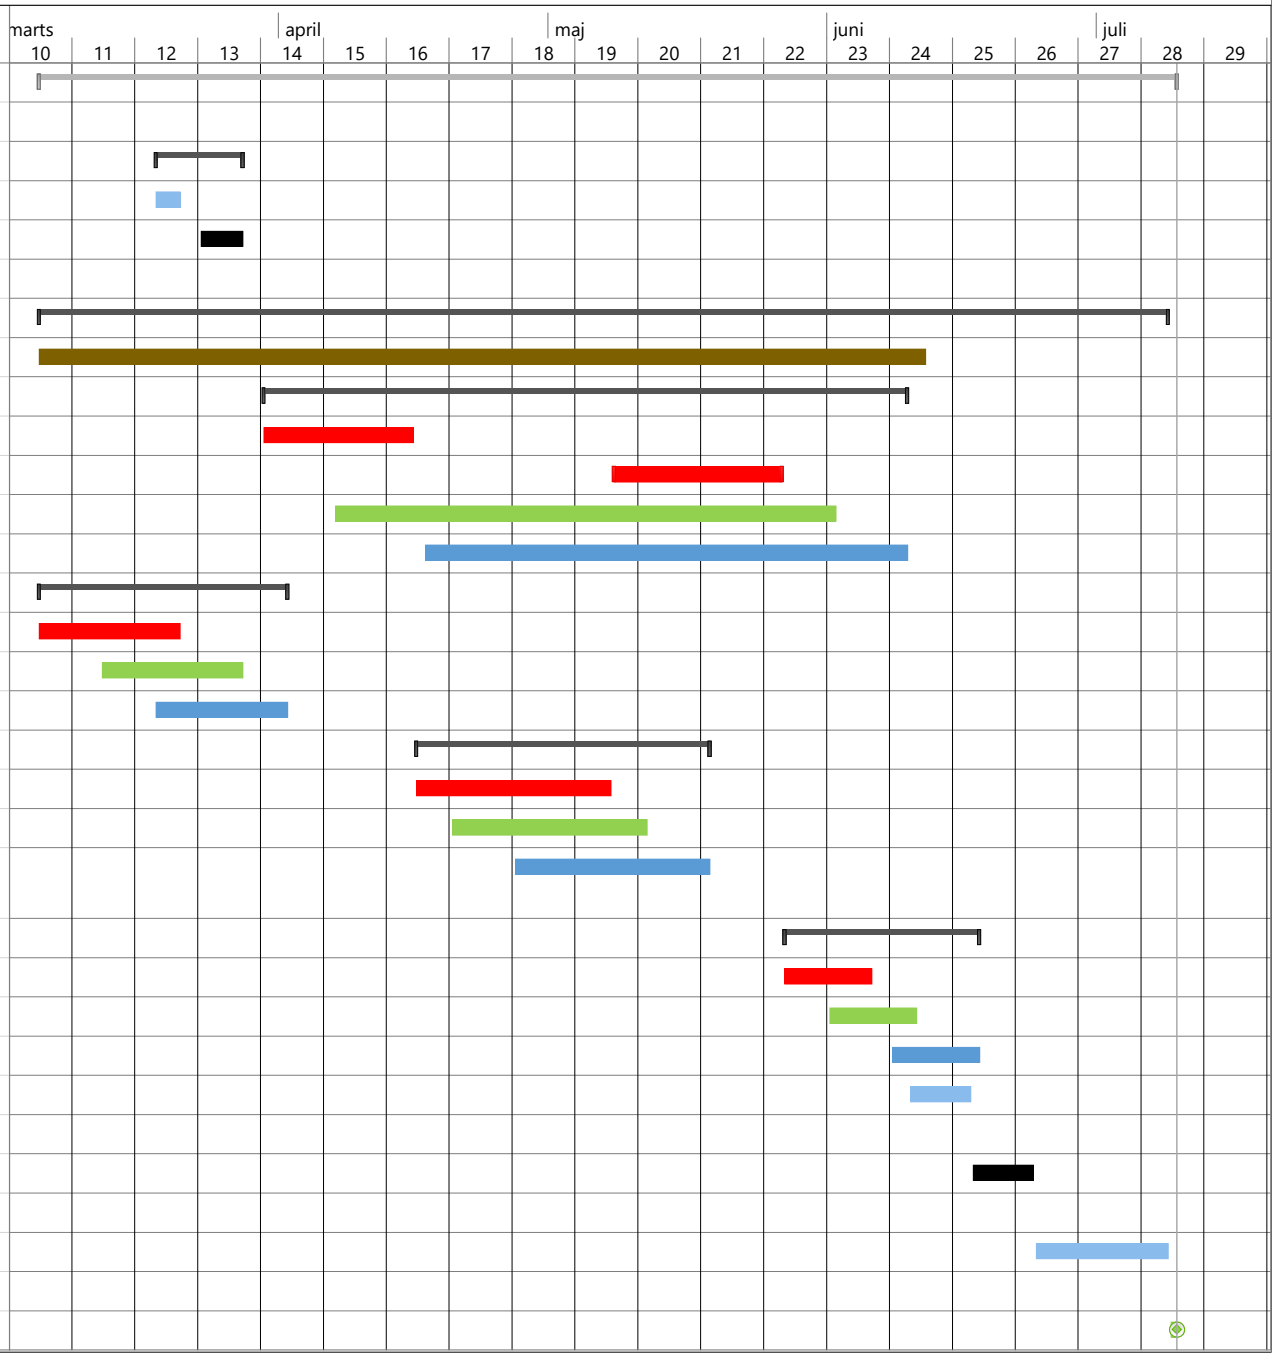
Id	Opgavenavn	Varighed
0	**Tidsplan, Vils Entreprenør 24-11-22**	**89 dage**
1		
2	**Gl. Aalborgvej Etape 3**	**6 dage**
3	Klargøring til asfalt, Gl. Aalborgvej	3 dage
4	Asfaltering Gl. Aalborgvej (inkl. afretning)	3 dage
5		
6	**Gillebakken**	**88 dage**
7	Opbrydning	69 dage
11	**Stamvej**	**52 dage**
12	Kloakering "stamvej" t.o.m brønd 320R	13 dage
15	Kloakering "stamvej" Fra brønd 320R - 330R	**13 dage**
18	Stikledninger "Stamvej"	40 dage
19	Retablering "stamvej" (Ekskl. Asfaltering)	38 dage
20	**Stikvej 9-19**	**18 dage**
21	Kloakering "Sidevej 9-19"	12 dage
24	Stikledninger "Sidevej 9-19"	10 dage
25	Retablering "Sidevej 9-19" (Ekskl. Asfaltering)	9 dage
26	**Stikvej 25-47**	**23 dage**
27	Kloakering "Sidevej 25-47"	16 dage
32	Stikledninger "Sidevej 25-47"	16 dage
33	Retablering "Sidevej 25-47" (ekskl. asfaltering)	16 dage
34	**Stikvej 22-24**	**16 dage**
35	Kloakering "Stikvej 22-24" inkl. underboring	8 dage
38	Stikledninger "Stikvej 22-24"	8 dage
39	Retablering "Stikvej 22-24" (Ekskl. Asfaltering)	8 dage
40	Spul og TV af udført anlæg	5 dage
41		
42	Asfaltering Gillebakken (inkl. afretning)	5 dage
43		
44	Gennemgang før aflevering	11 dage
45		
46	Delaflevering Etape 3	1 dag
